


VENTANILLA UNICA EN EL MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE HUILA

1. COMPARATIVO ESTADO DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN COMITÉ DIRECTIVO

De acuerdo con la información que reposa en las actas de comités Directivos, se encontró que para su Departamento con corte a 31 de Diciembre de 2009, se habían priorizado **28 proyectos**, de los cuales su estado en Ventanilla Única era el siguiente:

ESTADO DE PROYECTOS EN VENTANILLA	PROYECTOS PRIORIZADOS	VALOR – VENTANILLA
DEVUELTO PARA AJUSTES	15	5.646.897.780
EN ESTUDIO	0	0
POR PRESENTAR	11	6.996.390.861
VIABLE	2	1.210.481.647
Total general	28	13.853.770.288

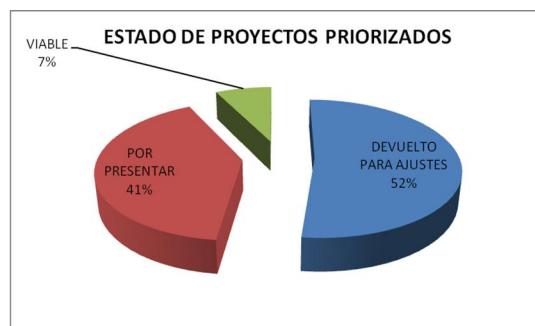

Con corte a 23 de Marzo de 2010, de acuerdo con la información que reposa en las actas de comités Directivos, se encuentra que para su Departamento no se han priorizado **proyectos adicionales** a los mencionados con corte 31 de Diciembre, sin embargo el estado en ventanilla única cambio de la siguiente manera:

ESTADO DE PROYECTOS EN VENTANILLA	PROYECTOS PRIORIZADOS	VALOR - VENTANILLA
DEVUELTO PARA AJUSTES	12	2.627.897.780
POR PRESENTAR	10	6.613.707.945
EN ESTUDIO	4	3.877.740.174
VIABLES	2	1.210.481.647
TOTAL GENERAL	28	14.329.827.546




Como se puede observar del 31 de Diciembre de 2009 a la fecha el PDA del Huila ha cambiado en cuatro proyectos los cuales fueron radicados el día 19 de marzo de 2010 y anteriormente se encontraban 3 devueltos y 1 por presentar. De otra parte la diferencia de recursos de \$476.057.258 se presenta, dado que los nuevos proyectos que están en estudio se radicaron por un valor superior al que se tenía definido con corte a 31 de Diciembre.

Vale la pena anotar que durante el día del 17 de Marzo del 2010 en las Instalaciones de Aguas del Huila, Gestor del del Huila, se realizo capacitación y revisión de los proyectos que se encuentran a la fecha en estudio.

2. TIEMPOS DE EVALUACION Y AJUSTE DE PROYECTOS

En relación con los tiempos de evaluación y viabilización de proyectos para su Departamento, este Ministerio ha realizado un análisis del tiempo transcurrido entre la radicación, evaluación, solicitud de ajustes y viabilización de los mismos, encontrando lo siguiente:

T VU TOTAL: Sumatoria de tiempos promedio que duro el proyecto en Ventanilla Única, hasta la solicitud de ajustes.
T R TOTAL: Sumatoria de tiempo promedio que duro el proyecto en la Región, hasta la presentación de ajustes.

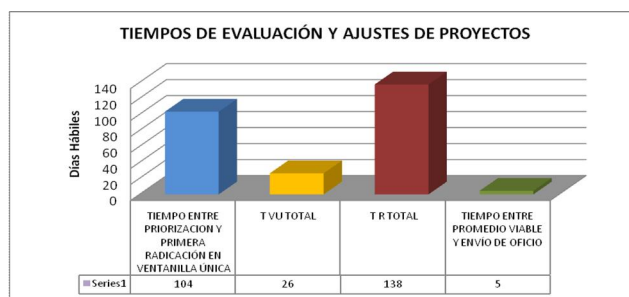

3. CAUSALES DE DEVOLUCION DE PROYECTOS POR PARTE DE LA VENTANILLA UNICA:

Tal como se evidencia en la grafica, de los 16 proyectos que han sido radicados en la ventanilla única:

- El 89% de los proyectos presentaban falencias de documentos legales
- El 17% de los proyectos presentaban falencias por permisos ambientales
- El 17% de los proyectos presentaban falencias por disponibilidad de predios
- El 89% de los proyectos presentaban falencias técnicas en las memorias, diseños y/o presupuesto.

